

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE MANUTENCAO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Ofício nº 072/2019 DMEE/SI/UFES

Vitória - ES, 02 de setembro de 2019

A Diretora de Manutenção de Edificações e Equipamentos Mikely Pereira Brito

Assunto: Manutenção no sistema de recalque do sistema de tratamento de resíduos gerados no R.U

Para atender à solicitação de aquisição de bomba para a caixa de gordura realizada pelo Departamento de Gestão de Restaurante – DGR, através do ofício 41/2019 – DGR/PROAECI/Ufes contido no processo 23068.037099/2019-34, foi realizado o levantamento de informações referentes à todo o sistema de tratamento de resíduos, conforme descrito abaixo:

1- O sistema de tratamento de resíduos é composto de sistema de recalque, peneira estática, caixa de gordura, filtro biológico anaeróbio e vala de infiltração, conforme figura 1;

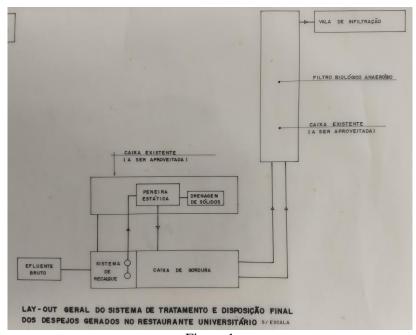


Figura 1

2- Segundo o projeto, a vala de infiltração (destino final dos resíduos), se encontra no gramado localizado entre a lagoa, o Restaurante Universitário-RU e a agência da Caixa Econômica. Ao vistoriarmos o local, foi verificado que as tubulações que interligam as caixas de passagem existentes, e consequentemente a vala de infiltração, estão todas danificas, conforme fotos em anexo;



Foto 1



Foto 2

3- Foi levantado junto ao DGR que entre os anos 2004 e 2007 eram servidas 600 refeições diárias e que hoje são servidas aproximadamente 4.000 refeições diárias.

Considerando o descrito acima, caso seja realizado a manutenção do sistema de recalque, todo o resíduo será destinado para a caixa de infiltração, o que causará o transbordamento do mesmo, gerando mau cheiro, proliferação de insetos e destinação inadequada do resíduo.

Sugiro que antes da realização da manutenção do sistema de recalque, seja avaliado se o sistema de tratamento de resíduos ainda atende à demanda atual do RU. Caso atenda, será necessário a manutenção na vala de infiltração existente para evitar os problemas descritos acima.

Caso entendam que a manutenção no sistema de recalque deva ser feita em paralelo aos demais serviços, favor retornar com o processo para que possamos dar prosseguimento.

Atenciosamente,
